

OEG 4

ATO 4

<p>Lieferung von geeignetem Flockungshilfsmittel auf den 5 Abwasserreinigungsanlagen der ARA Pustertal AG</p>	<p>Fornitura di flocculanti idonei per i 5 impianti di depurazione della società ARA Pusteria SPA</p>
---	--

<p>ARA Innichen-Sexten ARA Wasserfeld ARA Tobl ARA Sompunt ARA Unteres Pustertal</p>	<p>IDA San Candido-Sesto IDA Monguelfo IDA Tobl IDA Sompunt IDA Bassa Val Pusteria</p>
---	---

<p>Terminplan Cronoprogramma</p>
--

Datum: 28.02.2018
Änd./mod.
Änd./mod.
Beilage-Allegato
SI


 <small>ARA PUSTERTAL AG ABWASSERREINIGUNGSANLAGEN PUSTERTAL Pflaurenz/Tobl 54 - 39030 ST. LORENZEN Tel. 0474 479601 - Fax 0474 479641 MwSt. Nr.: 02524850417 St. Nr.: 02524850217</small> <p>ARA PUSTERTAL AG ARA PUSTERIA SPA</p>

 <p>Projektsteuerer-Coordiatore di progetto Dr. Ing. Konrad Engl</p>

<p>Dr. Ing. Konrad Engl Abwassertechnik-Verfahrenstechnik Pflaurenz-Tobl 54 I-39030 St. Lorenzen Tel.: 0474/479601 Fax: 0474/479641 Email: KonradE@arapustertal.it</p>



--

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	März 2018		
							KW 9	KW 10	KW 11
1	Autorizzazioni	11 Tage	Mi 28.02.18	Mi 14.03.18					
2	Consegna progetto	1 Tag	Mi 28.02.18	Mi 28.02.18		ARA Pustertal SpA			
3	Delibera CdA ARA Pusteria SPA	10 Tage	Do 01.03.18	Mi 14.03.18 2		ARA Pustertal SpA			
4	Bando di gara	40 Tage	Do 15.03.18	Mi 09.05.18 3		ARA Pustertal SpA			
5	Organizzazione lavori	25 Tage	Mo 11.06.18	Fr 13.07.18					
6	Ritiro campioni di 5 depuratori	5 Tage	Mo 11.06.18	Fr 15.06.18		Fornitori			
7	Test di flocculanti in laboratorio	5 Tage	Mo 18.06.18	Fr 22.06.18 6		Fornitori			
8	Compilazione e consegna allegato 3	10 Tage	Mo 25.06.18	Fr 06.07.18 7		Fornitori			
9	Fornitura 200 kg flocculanti per IDA Tobl	5 Tage	Mo 09.07.18	Fr 13.07.18 8		Fornitori			
10	Test in IDA Tobl	30 Tage	Mo 16.07.18	Fr 24.08.18					
11	Test in IDA Tobl	20 Tage	Mo 16.07.18	Fr 10.08.18 9		ARA Pustertal SpA			
12	Valutazione fornitori allgeato 4 a e comunicazione 3 vincitori	10 Tage	Mo 13.08.18	Fr 24.08.18 11		ARA Pustertal SpA			
13	Test in 4 impianti esterni	10 Tage	Mo 27.08.18	Fr 07.09.18					
14	Consegna offerta allegato 5 delle 3 ditte vincitrici	5 Tage	Mo 27.08.18	Fr 31.08.18 12		Fornitori			
15	Fornitura 50 kg flocculanti per ogni impianto	5 Tage	Mo 27.08.18	Fr 31.08.18 14EA-5 Tage		Fornitori			
16	Test sugli impianti esterni e valutazione	5 Tage	Mo 03.09.18	Fr 07.09.18 15		ARA Pustertal SpA			
17	Procedimento finale	39 Tage	Mo 10.09.18	Do 01.11.18					
18	Apertura prezzi unitari 3 vincitori allegato 5	1 Tag	Mo 10.09.18	Mo 10.09.18 16		ARA Pustertal SpA			
19	Pubblicazione del vincitore allgeato 4	4 Tage	Di 11.09.18	Fr 14.09.18 18		ARA Pustertal SpA			
20	Periodo di moratoria	25 Tage	Mo 17.09.18	Fr 19.10.18 19		ARA Pustertal SpA			
21	Firma del contratto	1 Tag	Mo 22.10.18	Mo 22.10.18 20		ARA Pustertal SpA			
22	Inizio contratto	1 Tag	Do 01.11.18	Do 01.11.18		ARA Pustertal SpA			

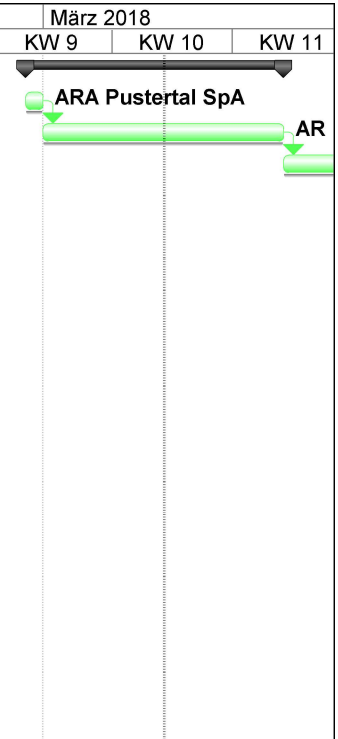


Projekt: Terminplan-Projekt-ARA Unt
Datum: Do 08.03.18

Vorgang		Meilenstein		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Sammelvorgang		Externer Meilenstein	
In Arbeit		Projektsammelvorgang		Stichtag	

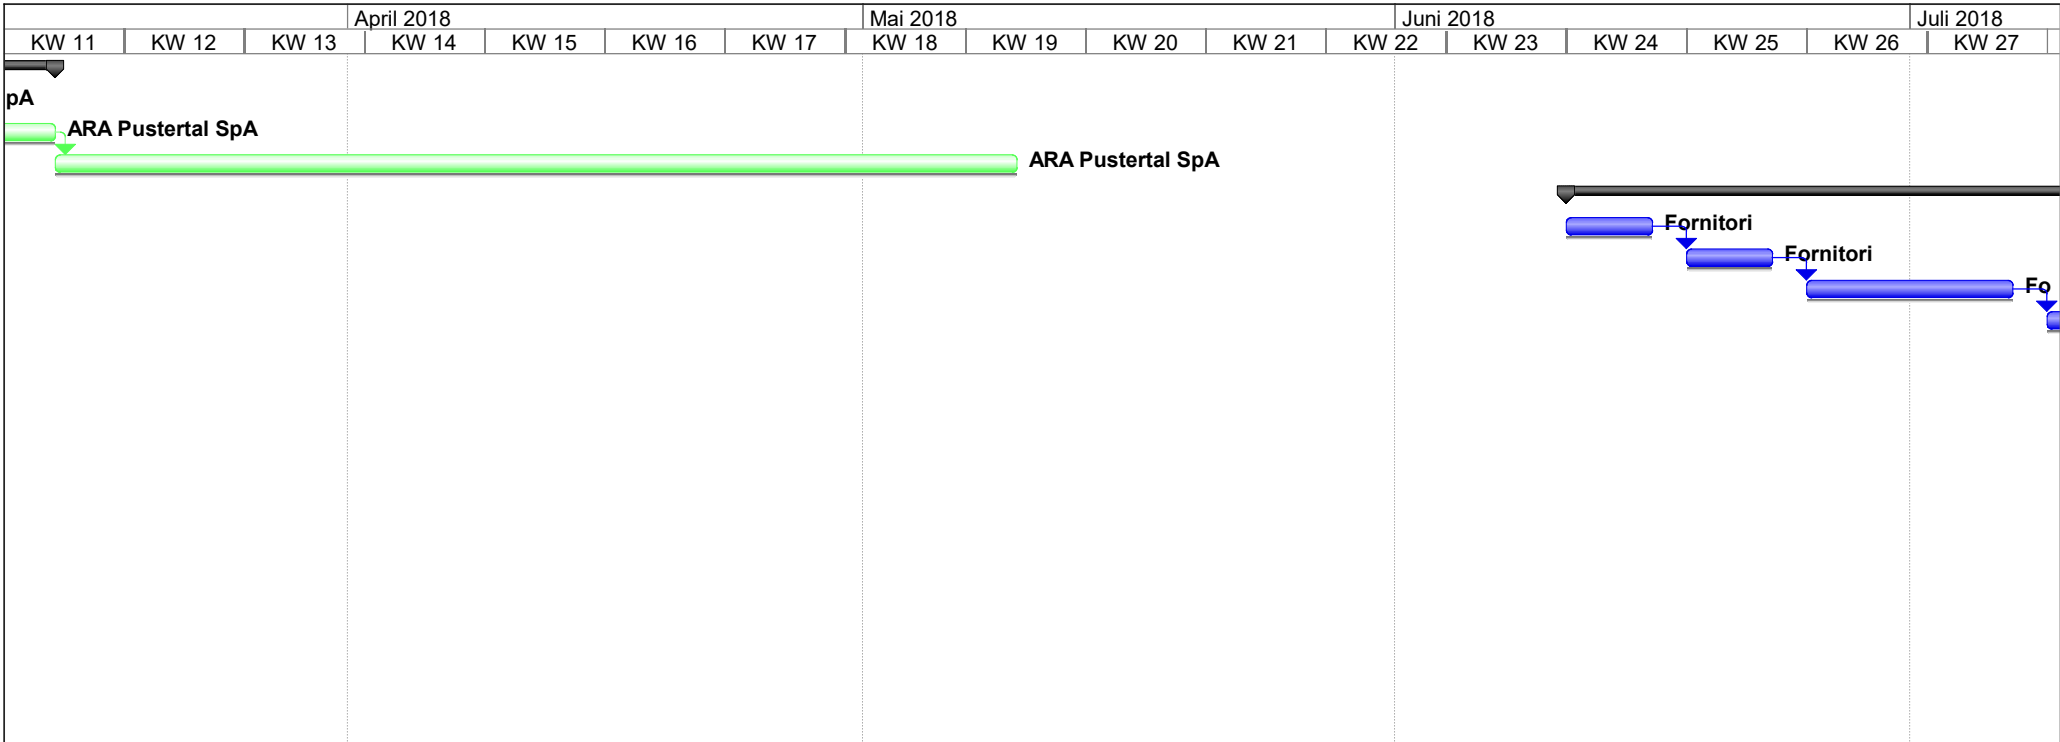

Projekt: Terminplan-Projekt-ARA Unt
 Datum: Do 08.03.18

- Vorgang Meilenstein
- Unterbrechung Sammelvorgang
- In Arbeit Projektsammelvorgang
- Externe Vorgänge
- Externer Meilenstein
- Stichtag

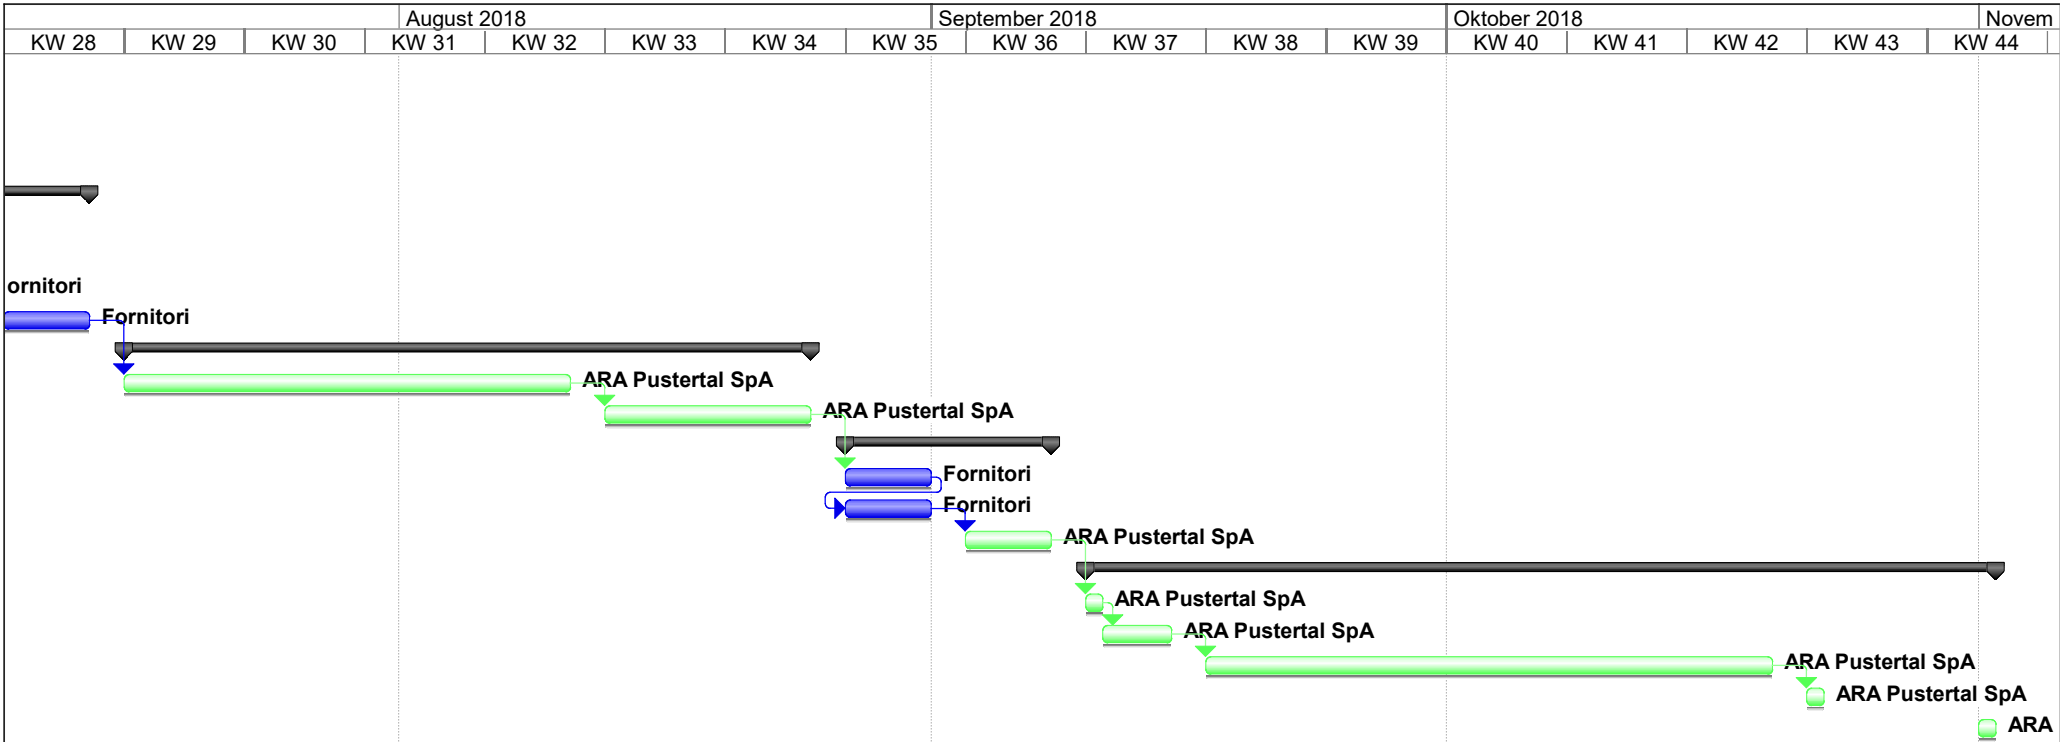

Projekt: Terminplan-Projekt-ARA Unt
 Datum: Do 08.03.18

Vorgang		Meilenstein		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Sammelvorgang		Externer Meilenstein	
In Arbeit		Projektsammelvorgang		Stichtag	
